Planejamento Estratégico — Portal Aprimora Comercial

Oct 9, 2026 · @Fabricio

1. Visão e objetivos

O Portal Aprimora deixa de ser um portal de toda a EJ e passa a ser **o sistema de trabalho exclusivo da Diretoria Comercial**, construído em volta do CRM (funil de vendas). As demais diretorias são deletadas. O que já está em produção (funil, empresas, negócio, agenda, tarefas, metas, push) é a base, não é refeito.

Problema. O time tem 7 pessoas (1 diretor e 6 assessores) com 10 a 15 h semanais cada. Boa parte desse tempo vai para tarefas de baixo valor: preencher cards, anotar ligações, montar e-mails, lembrar follow-ups e montar a R.I. Ao mesmo tempo, o maior gargalo do Comercial é a **falta de leads**.

Objetivos da v2:

1. **Devolver horas ao time.** Os agentes fazem o trabalho operacional (enriquecimento, anotação de ligação, e-mails, agenda) e o membro só confirma.
2. **Padronizar o processo.** Resultado de ligação, cadência e motivos de perda passam a ser campos fechados, não texto livre.
3. **Facilitar a gestão.** O diretor responde as perguntas da semana em segundos e prepara a R.I com um clique.
4. **Gerar informação nova.** Transcrição e avaliação das coldcalls, desempenho individual, análise semanal do ICP e motivos de perda.
5. **Funcionar no bolso.** Site e PWA, com cada membro vendo suas próprias tarefas e notificações.

Princípio de desenho: o agente prepara, o humano decide. Nada sai para o lead sem aprovação de um membro, e o preço final é sempre do diretor comercial.

2. Escopo

A v2 cobre o ciclo comercial inteiro, da entrada do lead até a passagem do projeto vendido para a Diretoria de Projetos.

Dentro da v2	Fora da v2 (decidido)
Funil, empresas, negócio e anexos (já existem)	Telas de Projetos, Marketing e Presidência
Processo padronizado: resultado de ligação, cadência, motivos de perda	Extração de leads no LinkedIn
Página inicial com as tarefas e lembretes de cada membro, com push	WhatsApp (continua pessoal, fora do sistema)
12 agentes e automações (Seção 5)	Aviso automático ao Financeiro
Desempenho individual (membro vê o seu; diretor vê todos)	CSAT e pós-venda (são da Presidência)
Diagnóstico e precificação digitais	Meta de volume de leads (definir depois)
Relatório da R.I e análise semanal do ICP	Importação do Pipefy antes do fim (fica para a última fase)
Dossiê de passagem para Projetos	

Permanecem como estão, sem evolução: Membros, Pontuação, Auditoria e o Painel geral.

3. Processo comercial padronizado

Três listas fechadas viram campos obrigatórios no banco. Sem elas não há indicador de coldcall, motivo de perda nem agente confiável. As listas ficam editáveis em Configurações do funil, como já acontece com origens e motivos.

3.1 Resultado de ligação

Toda ligação gera um registro com data, duração, resultado e próximo passo. O Agente de ligação sugere o resultado a partir da transcrição e o membro confirma.

Resultado	O que acontece com o card	Tarefa criada para o responsável
Não atendeu	Fica na fase; conta como tentativa	Próximo toque da cadência
Caixa postal	Fica na fase; conta como tentativa	Próximo toque da cadência
Barrado na secretária	Fica na fase; registra nome e melhor horário do decisor	Ligar no horário indicado

Resultado	O que acontece com o card	Tarefa criada para o responsável
Decisor indisponível, retornar	Fica na fase com data de retorno	Ligar na data combinada
Pediu e-mail	Fica na fase	Aprovar e-mail com material (gerado pelo Redator)
Sem interesse	Vai para Lead não qualificado, motivo “Sem interesse declarado”	—
Interessado, sem data	Vai para Oportunidade (SLA de 15 dias já existe)	Follow-up para marcar diagnóstico
Diagnóstico agendado	Vai para Diagnóstico agendado	Compromisso na agenda + briefing
Número errado	Fica na fase; marca o telefone como inválido	Corrigir telefone (Enriquecedor tenta antes)

3.2 Cadência padrão

Mantém o ritmo atual de **uma ligação por semana, por duas semanas**. A padronização define o dia e o canal de cada toque e intercala e-mails curtos, como é prática no mercado B2B: o e-mail aquece a ligação e a ligação dá contexto ao e-mail. A contagem pausa quando o lead responde.

Dia	Fase no funil	Toque	Quem faz
D0	E-mail	E-mail 1: apresentação personalizada	Redator prepara, membro aprova
D3	E-mail	E-mail 2: follow-up curto, com um caso ou dado do segmento	Redator prepara, membro aprova
D7	Coldcall (semana 1)	Ligação 1	Membro liga; Agente de ligação anota
D8	Coldcall (semana 1)	E-mail 3: “tentei falar com você”, só se não houve contato	Redator prepara, membro aprova
D14	Coldcall (semana 2)	Ligação 2	Membro liga; Agente de ligação anota
D15	Coldcall (semana 2)	E-mail 4: encerramento cordial, deixando a porta aberta	Redator prepara, membro aprova

Dia	Fase no funil	Toque	Quem faz
D21	Reciclagem	Sem resposta: vai para Reciclagem com retorno em 90 dias	Automático (SLA)

Os dias, os modelos e o prazo de retorno ficam configuráveis. Os modelos atuais de e-mail e o roteiro de coldcall ainda precisam ser enviados para virar a base do Redator.

3.3 Motivos de perda e desqualificação

O banco já exige motivo nas fases de perda. A v2 substitui a lista atual por estas duas e torna o comentário obrigatório quando o motivo for “Outro”.

Projeto não vendido (perda)	Lead não qualificado (desqualificação)
Preço acima do orçamento	Sem interesse declarado
Momento inadequado, adiou	Fora do perfil (porte ou segmento)
Sem orçamento	Empresa fechada ou inativa
Não percebeu valor	Contato inválido, sem alternativa
Escolheu outra consultoria	Pediu para não ser contatado (marca “não contatar”)
Parou de responder	Atendido recentemente pela Aprimora
Resolveu internamente	Outro (comentário obrigatório)
Outro (comentário obrigatório)	

3.4 Outros ajustes de processo

- **Proposta remarcada:** novo status `remarcada` na atividade, com a data nova. Isso alimenta o indicador de propostas remarcadas.
- **Valor por serviço:** cada serviço vendido no negócio recebe um valor próprio, para calcular o ticket médio por solução.
- **Remetente único:** os e-mails saem da conta pessoal do diretor na fase de testes e depois da conta comercial@ (Google Workspace).
- **Origens do lead:** a lista passa a ser Extração (Google), Apollo, Indicação, Evento, Instagram, LinkedIn (página, orgânico), Site, Tráfego pago, Pós-venda, Revenda e Manual.

4. Mapa de atividades e níveis de automação

Das 34 atividades mapeadas, só quatro continuam humanas: ligar, combinar a data do diagnóstico, conduzir o diagnóstico e decidir o preço. As demais passam a ser feitas ou preparadas pelo sistema.

Níveis: N0 humano · N1 assistido (a IA sugere, o membro faz) · N2 agente com aprovação (o agente faz, o membro aprova com um clique) · N3 autônomo (o agente faz e registra). **Todo lembrete vira tarefa na página inicial do responsável e notificação push.**

#	Etapa	Atividade	Hoje	Nível	Agente ou automação
P1	Prospecção	Extrair leads em massa (Google, Apollo)	Manual	N2 (diretor aprova o lote)	Prospector
P2	Prospecção	Checar duplicidade	Automático	N3	Já existe
P3	Prospecção	Distribuir o lead (rodízio)	Automático	N3	Já existe
P4	Prospecção	Preencher CNPJ, endereço, segmento e telefone	Manual, maior dor do time	N3	Enriquecedor
P5	Prospecção	Achar o decisor e os e-mails	Manual	N2	Enriquecedor
P6	Prospecção	Levantar possíveis dores	Opcional	N1	Enriquecedor
P7	Prospecção	Medir aderência ao ICP	Não existe	N3	Analista de ICP
P8	Prospecção	Cadastrar lead de evento ou indicação	Manual	N1 (cadastro rápido no celular)	Enriquecedor
C1	Cadência	Personalizar e-mail	Manual	N2 (membro aprova)	Redator
C2	Cadência	Enviar e-mails e follow-ups	Manual, conta do diretor	N2 (membro aprova)	Redator
C3	Cadência	Ler e classificar respostas	Manual	N2	Monitor de respostas
C4	Cadência	Decidir quem ligar hoje	Manual	N3	Organizador do dia
C5	Cadência	Fazer a ligação	Humano	N0	—
C6	Cadência	Anotar data, resposta e dores	Manual	N3	Agente de ligação
C7	Cadência	Registrar o resultado e mover o card	Sem padrão	N2 (membro confirma)	Agente de ligação

#	Etapa	Atividade	Hoje	Nível	Agente ou automação
C8	Cadência	Avaliar a ligação	Diretor, só no início	N3 (aba Desempenho individual)	Avaliador de ligações
C9	Cadência	Retornar futuro e Reciclagem	SLA automático	N3 + tarefa de retorno	Já existe
O1	Oportunidade	Combinar a data do diagnóstico	Humano	N0	—
O2	Oportunidade	Lançar o diagnóstico na agenda	Manual	N3	Agendador
O3	Oportunidade	Escolher os 2 acompanhantes	Manual	N1 (sugere por agenda livre)	Agendador
O4	Oportunidade	Confirmar com o lead na véspera	Indefinido	N2	Agendador
O5	Oportunidade	Briefing pré-diagnóstico	Não existe	N3	Agendador
O6	Diagnóstico	Aplicar o checklist	Papel	N0, em formulário digital	—
O7	Diagnóstico	Resumir o diagnóstico no card	Indefinido	N3	Assistente de proposta
E1	Proposta	Elaborar o escopo com Projetos	Humano	N1 (rascunho)	Assistente de proposta
E2	Proposta	Precificar	Planilha	N1 (pré-preenche); decisão N0 do diretor	Precificação digital
E3	Proposta	Montar o documento da proposta	Indefinido	N2	Assistente de proposta
E4	Proposta	Registrar apresentação e remarcação	Não registrada	N3	Regra no banco
E5	Proposta	Follow-up pós-proposta	Indefinido	N2 + tarefa	Redator
E6	Proposta	Registrar motivo de perda	Não registrado	N0 obrigatório + N1 sugestão	Regra no banco
G1	Pós-ganho	Dossiê de passagem para Projetos	Não existe	N3	Passagem
M1	Gestão	Relatório da R.I	Diretor monta toda semana	N3, **sob demanda (botão do diretor)**	Analista gerencial
M2	Gestão	Desempenho e plano de melhoria por membro	Informal	N3 painel; N2 plano	Analista gerencial
M3	Gestão	Análise do ICP	Não existe	N3, **toda sexta de manhã**	Analista de ICP

5. Agentes de IA

São 12 agentes. **Os três prioritários são o Enriquecedor, o Agente de ligação (com o Avaliador) e o Analista gerencial.** Três deles (A7, A10 e A12) são só regras no banco ou no n8n e não gastam IA, e outros três usam IA só no texto final, o que preserva a cota gratuita do Gemini para o que precisa de linguagem.

#	Agente	Prioridade	Tipo	Gatilho	O que entrega	Quem aprova
A1	Enriquecedor	1	IA + APIs públicas	Card entra em Enriquecimento	CNPJ, razão social, endereço, segmento e telefone (dados públicos de CNPJ e site do lead); decisor e e-mails sugeridos; hipóteses de dor; tarefa “completar dados” com o que faltar	Dados públicos: ninguém. Decisor e e-mail: o responsável
A2	Agente de ligação	1	IA (áudio)	Fim de uma ligação na API4COM	Transcrição, resumo, resultado sugerido (lista 3.1), dores marcadas, próximo passo e data; gravação no Drive	O responsável confirma resultado e fase
A3	Avaliador de ligações	1	IA	Depois do A2	Nota por critério da rubrica (abaixo) e comentários, na aba Desempenho individual	Ninguém (só leitura)
A4	Analista gerencial	1	Regra + IA	**Botão do diretor**	Relatório da R.I: indicadores gerais e individuais, travados por SLA, destaques e pontos de atenção; rascunho de plano de melhoria por membro	Diretor revisa o plano antes de compartilhar
A5	Redator de cadência	2	IA	Cada toque de e-mail da cadência (3.2) e follow-up pós-proposta	E-mail personalizado a partir do modelo e dos dados do lead, numa tarefa “aprovar e-mail”	Qualquer membro aprova os e-mails dos seus leads; o diretor aprova qualquer um

#	Agente	Prioridade	Tipo	Gatilho	O que entrega	Quem aprova
A6	Monitor de respostas	2	IA	Resposta chega na caixa de e-mail	Classificação (interessado, retornar depois, recusa, ausência, outro), resumo e fase sugerida; pausa a cadência	O responsável confirma
A7	Organizador do dia	2	Regra	Todo dia às 07h30	Fila de ligações e tarefas do dia na página inicial + push	—
A8	Agendador	3	Regra + IA	Resultado “Diagnóstico agendado” ou e-mail com data	Compromisso na agenda e no Google Calendar, sugestão de acompanhantes, e-mail de confirmação na véspera, briefing de 1 página	O responsável aprova a confirmação
A9	Assistente de proposta	3	IA	Checklist de diagnóstico salvo	Resumo do diagnóstico, mapa de maturidade por área, serviços sugeridos, rascunho de escopo e proposta	O responsável e Projetos
A10	Passagem para Projetos	3	Regra	Card entra em Projetos Aprimora	Dossiê em PDF com tudo do card (dados, contatos, ligações, diagnóstico, proposta, anexos) e tarefa para a Diretoria de Projetos	—
A11	Analista de ICP	4	Regra + IA	**Toda sexta às 08h**	Conversão por segmento, porte, cidade e origem; recomendação de foco da semana; score de aderência de cada lead	Diretor Iê

#	Agente	Prioridade	Tipo	Gatilho	O que entrega	Quem aprova
A12	Prospector	4	APIs + regra	Sob demanda, com filtros (segmento, cidade, porte)	Lote de leads do Google Maps ou Apollo, já sem duplicados	Diretor aprova o lote

5.1 Rubrica do Avaliador de ligações

Cada critério recebe nota de 1 a 4, a mesma escala do checklist de diagnóstico. A rubrica fica configurável pelo diretor.

1. **Abertura:** apresentação clara da Aprimora e do motivo da ligação nos primeiros 40 segundos.
2. **Decisor:** chegou ou tentou chegar a quem decide.
3. **Descoberta:** perguntas sobre a operação e as dores do lead.
4. **Proposta de valor:** ligou a dor do lead a um serviço da Aprimora.
5. **Objeções:** respondeu sem encerrar a conversa.
6. **Próximo passo:** saiu com uma data, um e-mail ou um retorno combinado.
7. **Escuta:** proporção de fala entre membro e lead.

5.2 Diagnóstico e precificação digitais

- **Checklist de diagnóstico:** o formulário impresso vira tela no PWA, para usar no celular dentro da fábrica. São 10 áreas (Mapeamento de processos, Pesquisa de mercado, Gestão de custos, Planejamento estratégico, Cronoanálise, Gestão de estoque, Layout, PCP, Desperdício e 5S), com cerca de 5 perguntas cada, nota de 1 a 4 e comentário. Fotos e áudio são opcionais. A média por área gera o mapa de maturidade que o A9 usa para sugerir serviços.
- **Precificação:** a planilha vira uma tela ligada ao negócio, com as mesmas fórmulas: fatores multiplicativos (cliente recorrente, prazo, concorrência, entregas fora do padrão, complexidade, porte, capacidade operacional), horas de consultores e gerentes, custos do projeto, margem mínima e imposto. A tela calcula o preço mínimo e o máximo e mostra o preço de projetos parecidos já vendidos. **O diretor comercial registra o preço final**, que vira o `valor` do negócio.

6. Módulos e telas

O menu passa a ter o Comercial como centro. São quatro telas novas e cinco ajustes em telas que já existem.

Tela	Situação	Quem vê	O que muda
Início (Minhas tarefas)	Ajuste em `/painel`	Cada membro, só o seu	Fila do dia (ligações, follow-ups, e-mails para aprovar, compromissos, retornos), com ações em um toque. Tarefas criadas pelo sistema e pelos agentes, além das do diretor. Cada uma vira push
Funil	Ajuste em `/funil`	Todos	Selo de resultado da última ligação, etapa da cadência e score de ICP no card
Negócio	Ajuste em `/negocios/[id]`	Todos	Linha do tempo única: ligações (áudio, transcrição, resumo), e-mails, respostas, diagnóstico, precificação, proposta. Botão do dossiê
Caixa de aprovação	Nova	Cada membro; diretor vê todas	E-mails e sugestões de agentes esperando aprovação, com editar, aprovar ou descartar
Desempenho individual	Nova	Membro vê o seu; diretor vê todos	Indicadores do membro, notas da rubrica ao longo do tempo, transcrições e avaliações das ligações, plano de melhoria (depois que o diretor libera)
Diagnóstico	Nova	Todos (edita quem participa)	Checklist digital, mapa de maturidade, fotos e áudio

Tela	Situação	Quem vê	O que muda
Precificação	Nova	Membros; preço final só o diretor	Calculadora ligada ao negócio
Painel comercial	Ajuste em `/comercial`	Todos; visão por membro só o diretor	Novos indicadores (Seção 7), botão “Gerar relatório da R.I” (diretor) e aba ICP com a análise de sexta
Configurações do funil	Ajuste em `/funil/configuracoes`	Diretor	Listas da Seção 3, cadência, modelos de e-mail, rubrica e liga/desliga de cada agente

Mudança de permissão necessária: hoje só o diretor cria tarefas. A v2 precisa que o sistema e os agentes criem tarefas para qualquer responsável, com uma coluna `origem` (manual, sistema ou agente) e um vínculo com o negócio.

7. Indicadores

Sete dos 16 indicadores pedidos já são calculados. Os outros dependem das listas da Seção 3 ou de pequenas mudanças no banco. Todos aparecem no geral e por membro.

Indicador	Definição	Situação
Leads novos	Negócios criados no período	Já existe
Diagnósticos marcados	Entradas em Diagnóstico agendado	Já existe
Propostas apresentadas	Entradas em Apresentação de proposta	Já existe
Propostas remarcadas	Atividades de proposta com status `remarcada`	Novo (status `remarcada`)
Contratos	Entradas em Projetos Aprimora	Já existe
Ticket médio	Faturamento ÷ contratos	Já existe
Ticket por solução	Soma do valor de cada serviço ÷ contratos com esse serviço	Novo (valor por serviço)


Indicador	Definição	Situação
Ciclo de venda	Média de dias entre a criação do card e a entrada em **Projetos Aprimora**	Já existe (confirmado)
Conversão por fase	% que chega à fase seguinte	Já existe
Pipeline ponderado	Soma de valor × probabilidade da fase atual, nos negócios abertos	Novo (a probabilidade já existe nas fases)
Tempo por fase, SLA e saídas	Tempo médio, % dentro do SLA e para onde os negócios saíram	Parcial (falta % no SLA e destinos)
Desempenho por membro	Todos os indicadores pelo responsável **da época** da movimentação	Corrigir: hoje usa o responsável atual
Origem dos leads	Leads, conversão e faturamento por origem	Existe; falta a lista nova de origens
Motivos de perda	Distribuição por motivo, por fase de saída e por membro	Novo (lista 3.3)
Coldcall	Ligações feitas, % por resultado, % que vira diagnóstico, nota média da rubrica	Novo (lista 3.1 e A3)
Cadência de e-mail	Enviados, taxa de resposta, respostas por classificação	Novo (A5 e A6)

Para não ficar lento com o crescimento, os indicadores passam a ser calculados no banco, em vez de na memória da Vercel a cada acesso.

8. Arquitetura, integrações e custos

A arquitetura já desenhada no repositório é mantida: o portal guarda o trabalho numa fila e o n8n, numa VPS da Hostinger, busca cada item, chama a IA e os serviços externos e devolve o resultado. Se o n8n cair, nada se perde e o portal continua funcionando.

O portal guarda a fila; o n8n executa os agentes

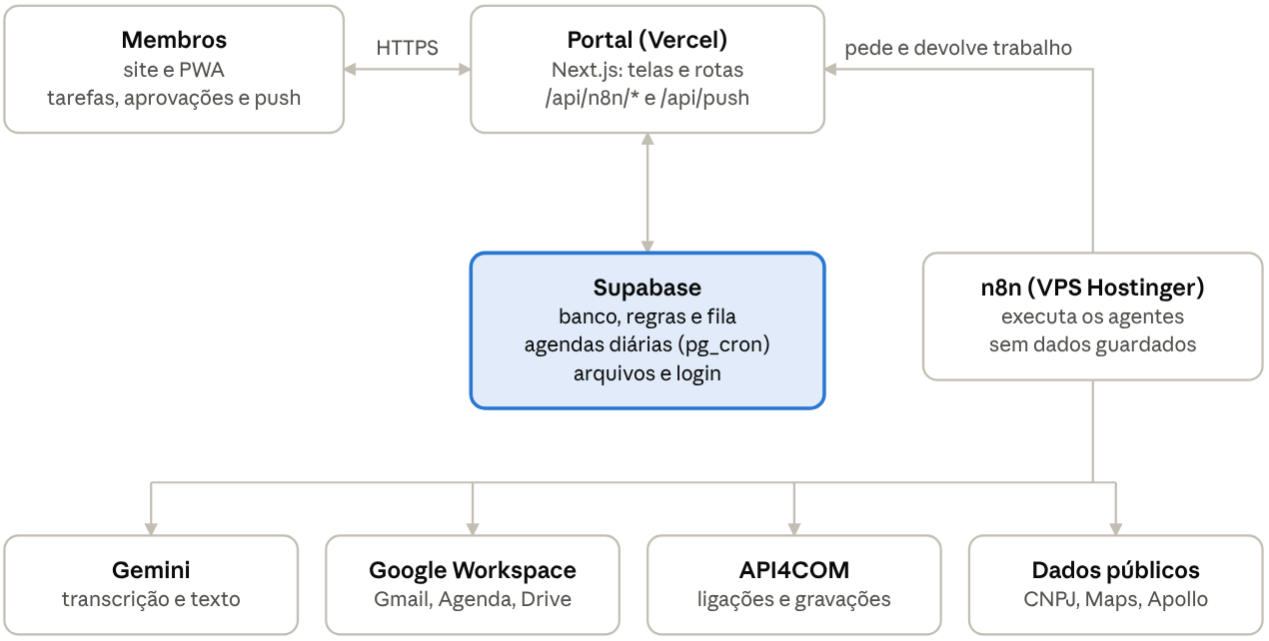

arquitetura · portal, banco, n8n e serviços externos

O único ponto que guarda dados é o Supabase. A gravação da API4COM chega por webhook ao portal, entra na fila e só então vai para o n8n. As rotas `/api/n8n/*` previstas no `n8n/README.md` são o primeiro código a escrever.


Item	Uso	Situação
Vercel	Portal (site e PWA)	Já em uso
Supabase	Banco, regras, fila, arquivos, login	Plano gratuito; pago só se faltar espaço
VPS Hostinger	n8n (gratuito, auto-hospedado)	A contratar
API do Gemini	Transcrição, resumos, classificação, textos	Plano gratuito (ver risco na Seção 10)
Google Workspace	Envio de e-mails, agenda, gravações no Drive	Conta pessoal do diretor nos testes, depois comercial@
API4COM	Ligações e gravações	Já contratada
Plano Claude (R$ 110/mês)	Desenvolvimento do portal	Para construir, não para rodar os agentes

Item	Uso	Situação
Dados públicos de CNPJ, Google Maps, Apollo	Enriquecimento e prospecção	Gratuitos dentro dos limites de cada um

9. Roadmap por fases

O portal evolui em sete fases, uma por vez. Cada fase termina utilizável, e a seguinte só começa quando o portão da anterior é cumprido. Não há datas fixas, porque o ritmo depende do tempo de desenvolvimento disponível.

Sete fases, cada uma liberada por um portão

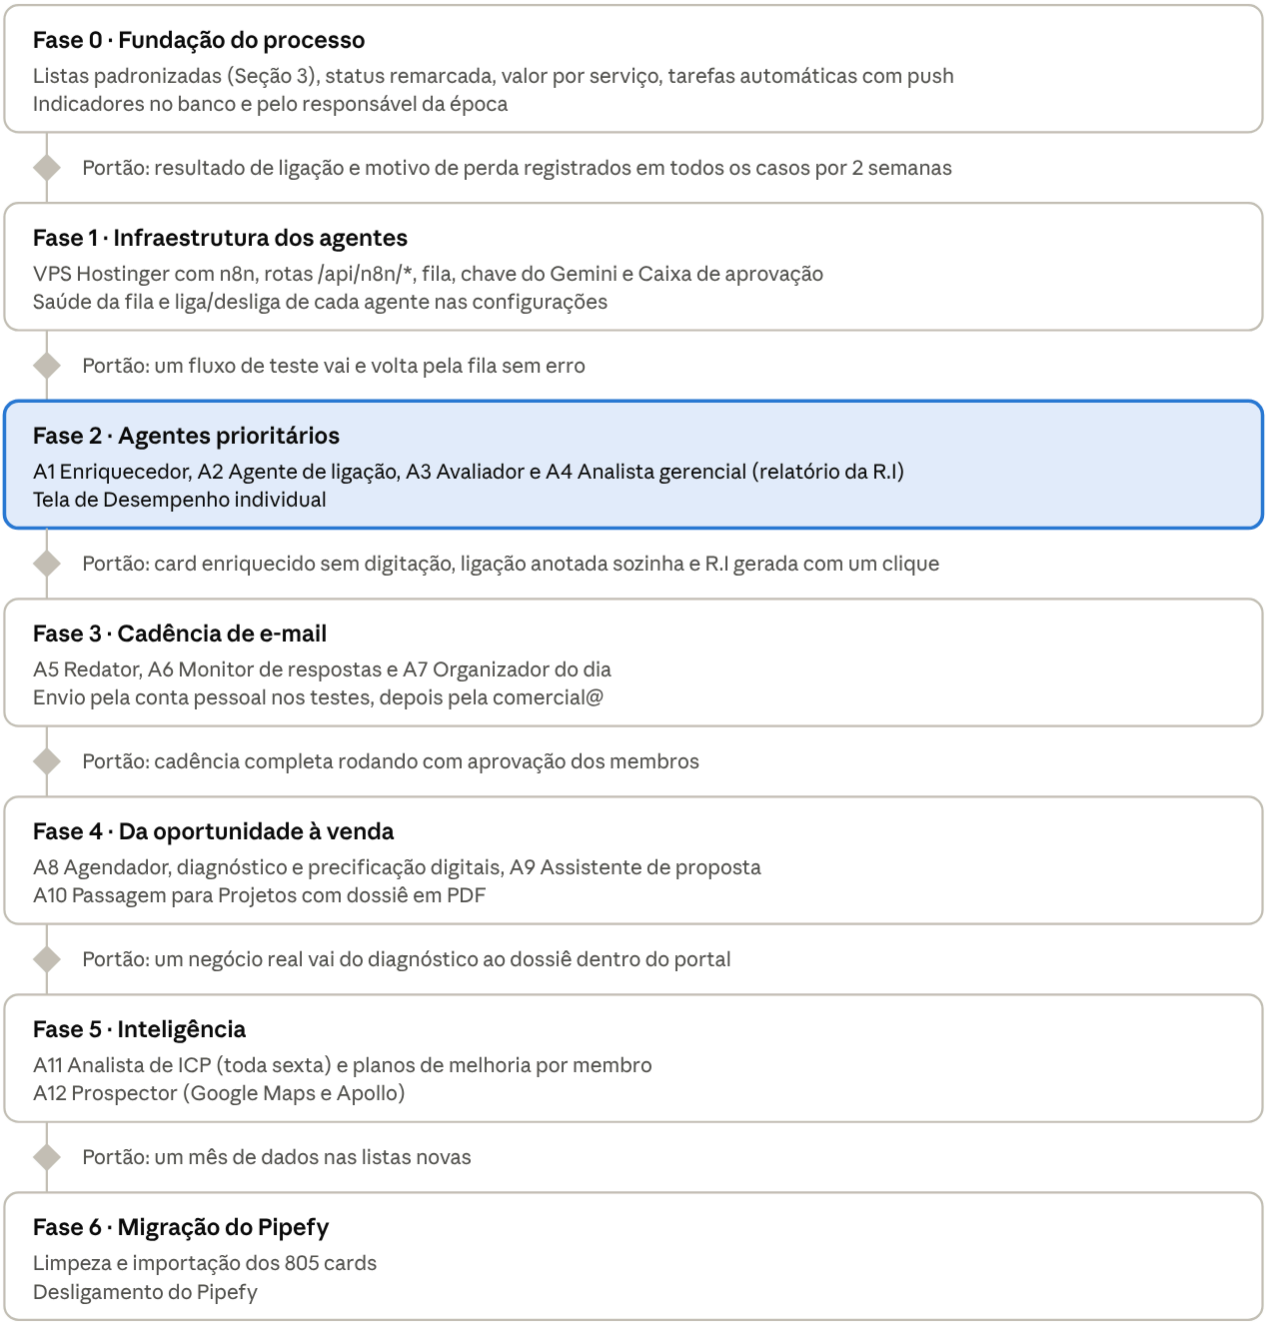

roadmap · 7 fases e seus portões

A Fase 0 vem antes dos agentes porque eles dependem das listas padronizadas para registrar e medir o trabalho. O Pipefy fica por último, como decidido, e continua ativo até a importação.

10. Riscos, premissas e decisões pendentes

Risco	Impacto	Como tratar
No plano gratuito, o Google pode usar os dados enviados ao Gemini para melhorar seus produtos	Transcrições com dados de leads saem do controle da Aprimora	Conferir os termos atuais da API antes da Fase 2; se confirmado, avaliar o plano pago só para áudio ou anonimizar nomes e telefones
Limites de uso do Gemini gratuito	Agentes param no meio do dia	Fila no portal com novas tentativas; regras sem IA onde der (Seção 5)
VPS única para o n8n	Se cair, os agentes param	O portal funciona sem o n8n; a fila guarda o trabalho até a volta
Limite de envio do Gmail e reputação do domínio	E-mails vão para spam	Volume baixo por dia, aquecimento da conta comercial@, SPF/DKIM configurados
Time aprova sem ler	E-mail ruim chega ao lead	Aprovação mostra o texto inteiro; diretor audita uma amostra semanal
Gravação de ligações	Exigência de aviso ao lead	Decidido: sem preocupação específica no momento; manter a opção de aviso no roteiro
Equipe de desenvolvimento pequena	Fases atrasam	Uma fase por vez, cada uma utilizável ao terminar

Premissas: orçamento limitado a VPS Hostinger, plano Claude para desenvolvimento e Supabase gratuito (ou pago, se necessário); API do Gemini; API4COM já contratada; Pipefy desligado só depois da importação.

Decisões pendentes:

- [ ] Meta de volume de leads novos por semana
- [ ] Enviar os modelos de e-mail e o roteiro de coldcall atuais
- [ ] Validar a rubrica de avaliação de ligações (5.1)
- [ ] Ligar as 10 áreas do checklist aos serviços da Carta de Serviços

- [ ] Confirmar a fórmula do “multiplicativo ambiente” da planilha de precificação
- [ ] Confirmar se a Apollo será usada no plano gratuito
- [ ] Definir quem da Diretoria de Projetos recebe o dossiê de passagem
